

クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 28 年 6 月》

草津市 環境経済部
廃棄物処理施設建設室

主な工事内容 (H28.6)


1 掘削工事

4月、5月に引き続き、ごみピット地下部分の掘削を行った。



2 基礎配筋工事

ごみピット部分の掘削完了、躯体工事の実施にあたり、地下基礎部分の砕石敷き、捨てコン打設、配筋工事を行った。

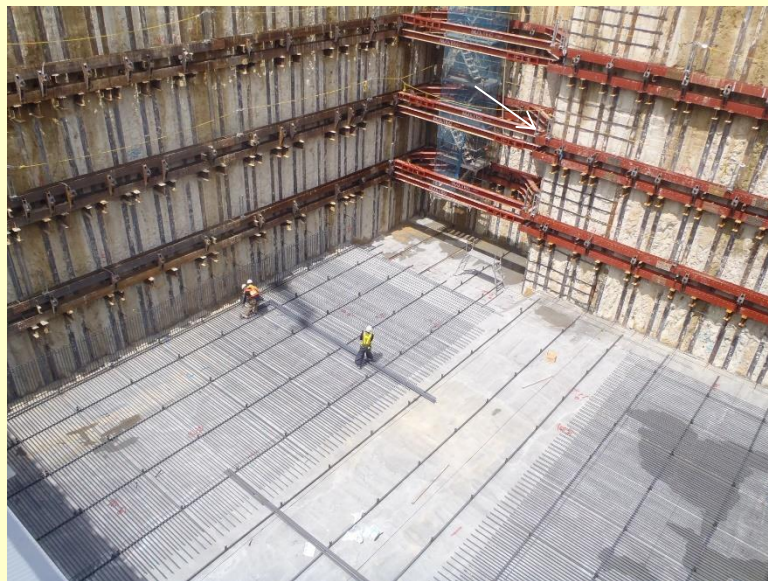

3 コンクリート工事

ごみピット部分の配筋工事完了後、地下基礎のコンクリートを打設した。



4 事業用地の様子（前月との比較）

