

# 《平成29年度 建設部 組織目標の達成状況》


## ◆目標管理者

技 監	東 隆 司
部 長	吉 川 寛

**重**

平成29年度予算重点施策に関連する項目には、「4.課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

1. 現状認識 (重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など)	2. 重点目標	3. 目標達成のための取り組みと成果目標	4. 課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組 【年度末実績】
<p>・主要幹線道路における交通量の増加等により慢性的な交通渋滞が生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、主要幹線道路の整備と、安全で快適な道路空間の整備が求められています。</p> <p>① 道路施設の老朽化や大規模な災害の発生の可能性を踏まえた道路の適正な管理を行うため、道路法で義務付けられた橋梁や舗装、道路附属物の点検・調査を行い、最小限の維持管理コストで道路の安全・安心な通行の確保を目的とした修繕事業の取り組みが必要となっています。</p>	<p>・主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計画的に進め、早期整備完了を目指します。</p> <p>① 道路施設については、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平準化等への方向転換に取り組み、道路の安全・安心な通行を確保するための点検・設計・工事を進めます。</p>	<p>【取組】 大江霊仙寺線南笠工区の整備を進めます。 平成29年度実施事業費 131,000千円 繰越47,682千円+現年83,318千円</p> <p>①</p> <p>【成果目標】 整備率 10.7% (H28年度末 3.0%)</p> <p>【取組】 市道長寿命化事業を進めます。 平成29年度実施事業費 243,151千円 繰越26,954千円+現年216,197千円</p> <p>②</p> <p>【成果目標】 長寿命化を計画した橋梁のうち修繕に着手した橋梁進捗率 6.4% (H28年度末 3.2%)</p>	<p>【取組実績】 大江霊仙寺線南笠工区(その1)事業について、南草津プリムタウン土地区画整理組合の工程にあわせて実施しました。 平成29年度実施事業費 47,682千円 繰越47,682千円+現年0千円</p> <p>①</p> <p>【成果目標実績】 整備率 3.0% (H28年度末 3.0%)</p> <p>【取組実績】 市道長寿命化事業を実施しました。 平成29年度実施事業費 166,375千円 繰越38,430千円+現年127,845千円</p> <p>②</p> <p>【成果目標実績】 進捗率 4.0% (H28年度末 3.2%)</p>
<p>・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているなか、排水能力が不足している河川が市内に一定あることから、河川・排水路の氾濫が危惧されます。</p> <p>② 雨水幹線整備については、接続先となる一級河川整備の未整備が多く、雨水幹線整備計画の支障となっています。</p>	<p>② 市内の雨水幹線整備を計画的に進めるとともに、河川・排水路の適切な管理による治水対策を行います。</p>	<p>【取組】 雨水幹線の整備を進めます。 平成29年度実施事業費 504,030千円 繰越206,030千円+現年298,000千円</p> <p>③</p> <p>【成果目標】 平成27年度末の雨水幹線整備面積に対する進捗増加率 0.7% (H28年度末 0.2%)</p>	<p>【取組実績】 雨水幹線の整備を実施しました。 平成29年度実施事業費 206,854千円 繰越206,030千円+現年824千円</p> <p>③</p> <p>【成果目標実績】 平成27年度末からの雨水幹線整備面積に対する進捗増加率 0.3% (H28年度末 0.2%)</p>
<p>・市民の憩いと安らぎが感じられる、緑地・オープンスペースの確保、整備が求められています。</p> <p>③ 老朽化が進む市内の都市公園において、安全性の確保と機能保全を図るため、公園施設の維持管理や長寿命化対策を計画的に進める必要があります。</p> <p>・公共空間での市民協働によるガーデニング等の取り組みを進める「ガーデンシテイくさつ」を実現し、まちの心地よさ、魅力の向上を図る必要があります。</p>	<p>・緑の基本計画に基づき市民1人あたりの都市公園面積を7㎡にするため、野路公園および野村公園の整備を進めます。</p> <p>③ 野村公園の整備については、中心市街地におけるにぎわい拠点の整備として、市民スポーツの拠点である野村市民体育館をスポーツのほかにも各種イベントが実施可能な体育館の建て替え工事に着手します。</p> <p>・公園施設長寿命化計画に基づき、効率的、効果的な施設の改修または更新を行います。</p> <p>・「ガーデンシテイくさつ」の推進について、その実現に向けた具体的な施策展開を図るため、第2次草津市緑の基本計画の見直しを行います。</p>	<p>【取組】 野路公園および野村公園の整備を行います。 (野路公園整備費) 平成29年度実施事業費 43,038千円 (野村公園整備費) 平成29年度実施事業費 2,216,097千円</p> <p>④</p> <p>【成果目標】 野路公園の用地を取得します。 野村公園(体育館建設工事) 進捗率 40%</p> <p>【取組】 都市公園内の施設の長寿命化事業を進めます。 平成29年度実施事業費 67,981千円</p> <p>⑤</p> <p>【成果目標】 都市公園および児童遊園の修繕・再整備を実施します。</p> <p>【取組】 第2次草津市緑の基本計画を見直します。 平成29年度実施事業費 5,921千円</p> <p>⑥</p> <p>【成果目標】 「ガーデンシテイくさつ」の実現に向けた課題整理や具体的施策の検討を行います。</p>	<p><b>重</b></p> <p>【取組実績】 野路公園および野村公園の整備を行いました。 (野路公園整備費) 平成29年度実施事業費 2,328千円 (野村公園整備費) 平成29年度実施事業費 1,883,000千円</p> <p>④</p> <p>【成果目標実績】 野路公園の用地を取得しました。 野村公園(体育館建設工事)の整備を実施しました。 進捗率 40%</p> <p>【取組実績】 都市公園内の施設の長寿命化事業を進めました。 平成29年度実施事業費 55,653千円</p> <p>⑤</p> <p>【成果目標実績】 都市公園および児童遊園の修繕・再整備を実施しました。</p> <p>【取組実績】 第2次草津市緑の基本計画を見直しました。 平成29年度実施事業費 5,451千円</p> <p>⑥</p> <p>【成果目標実績】 「ガーデンシテイくさつ」の実現に向けた課題整理や具体的施策の検討を行い、「第2次草津市みどりの基本計画(改定版)」の案を作成しました。</p>

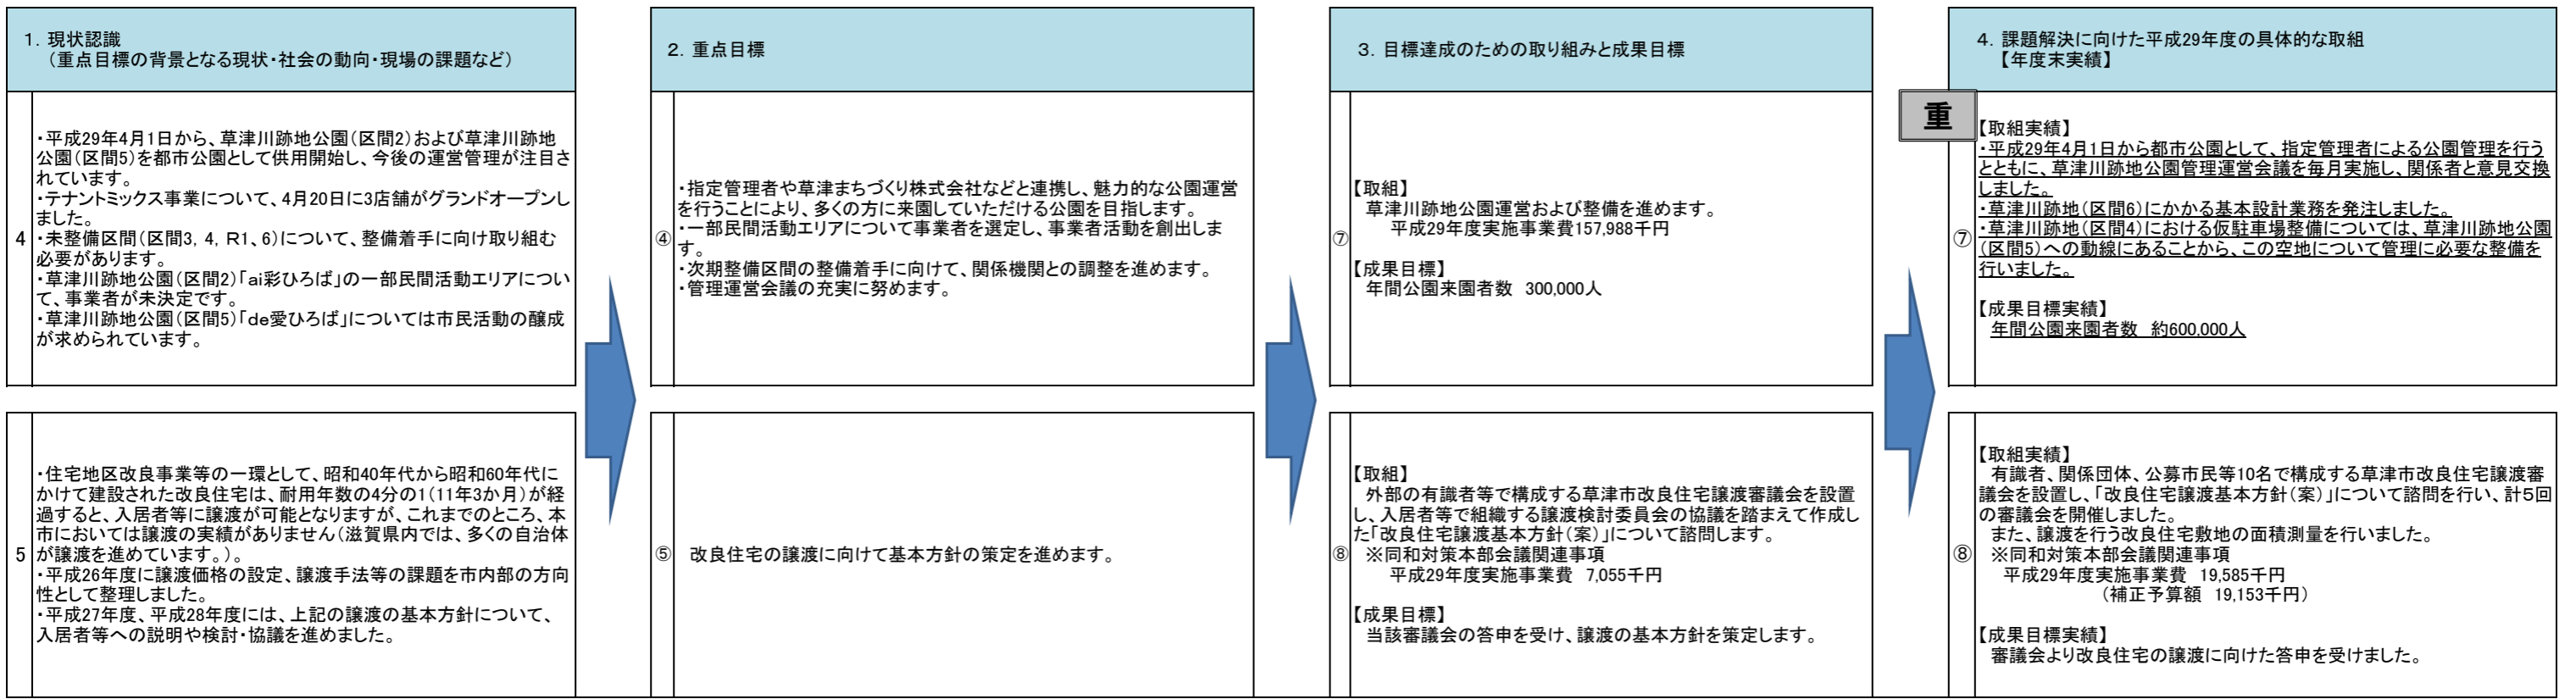

重
