


# 全体工程の変更について

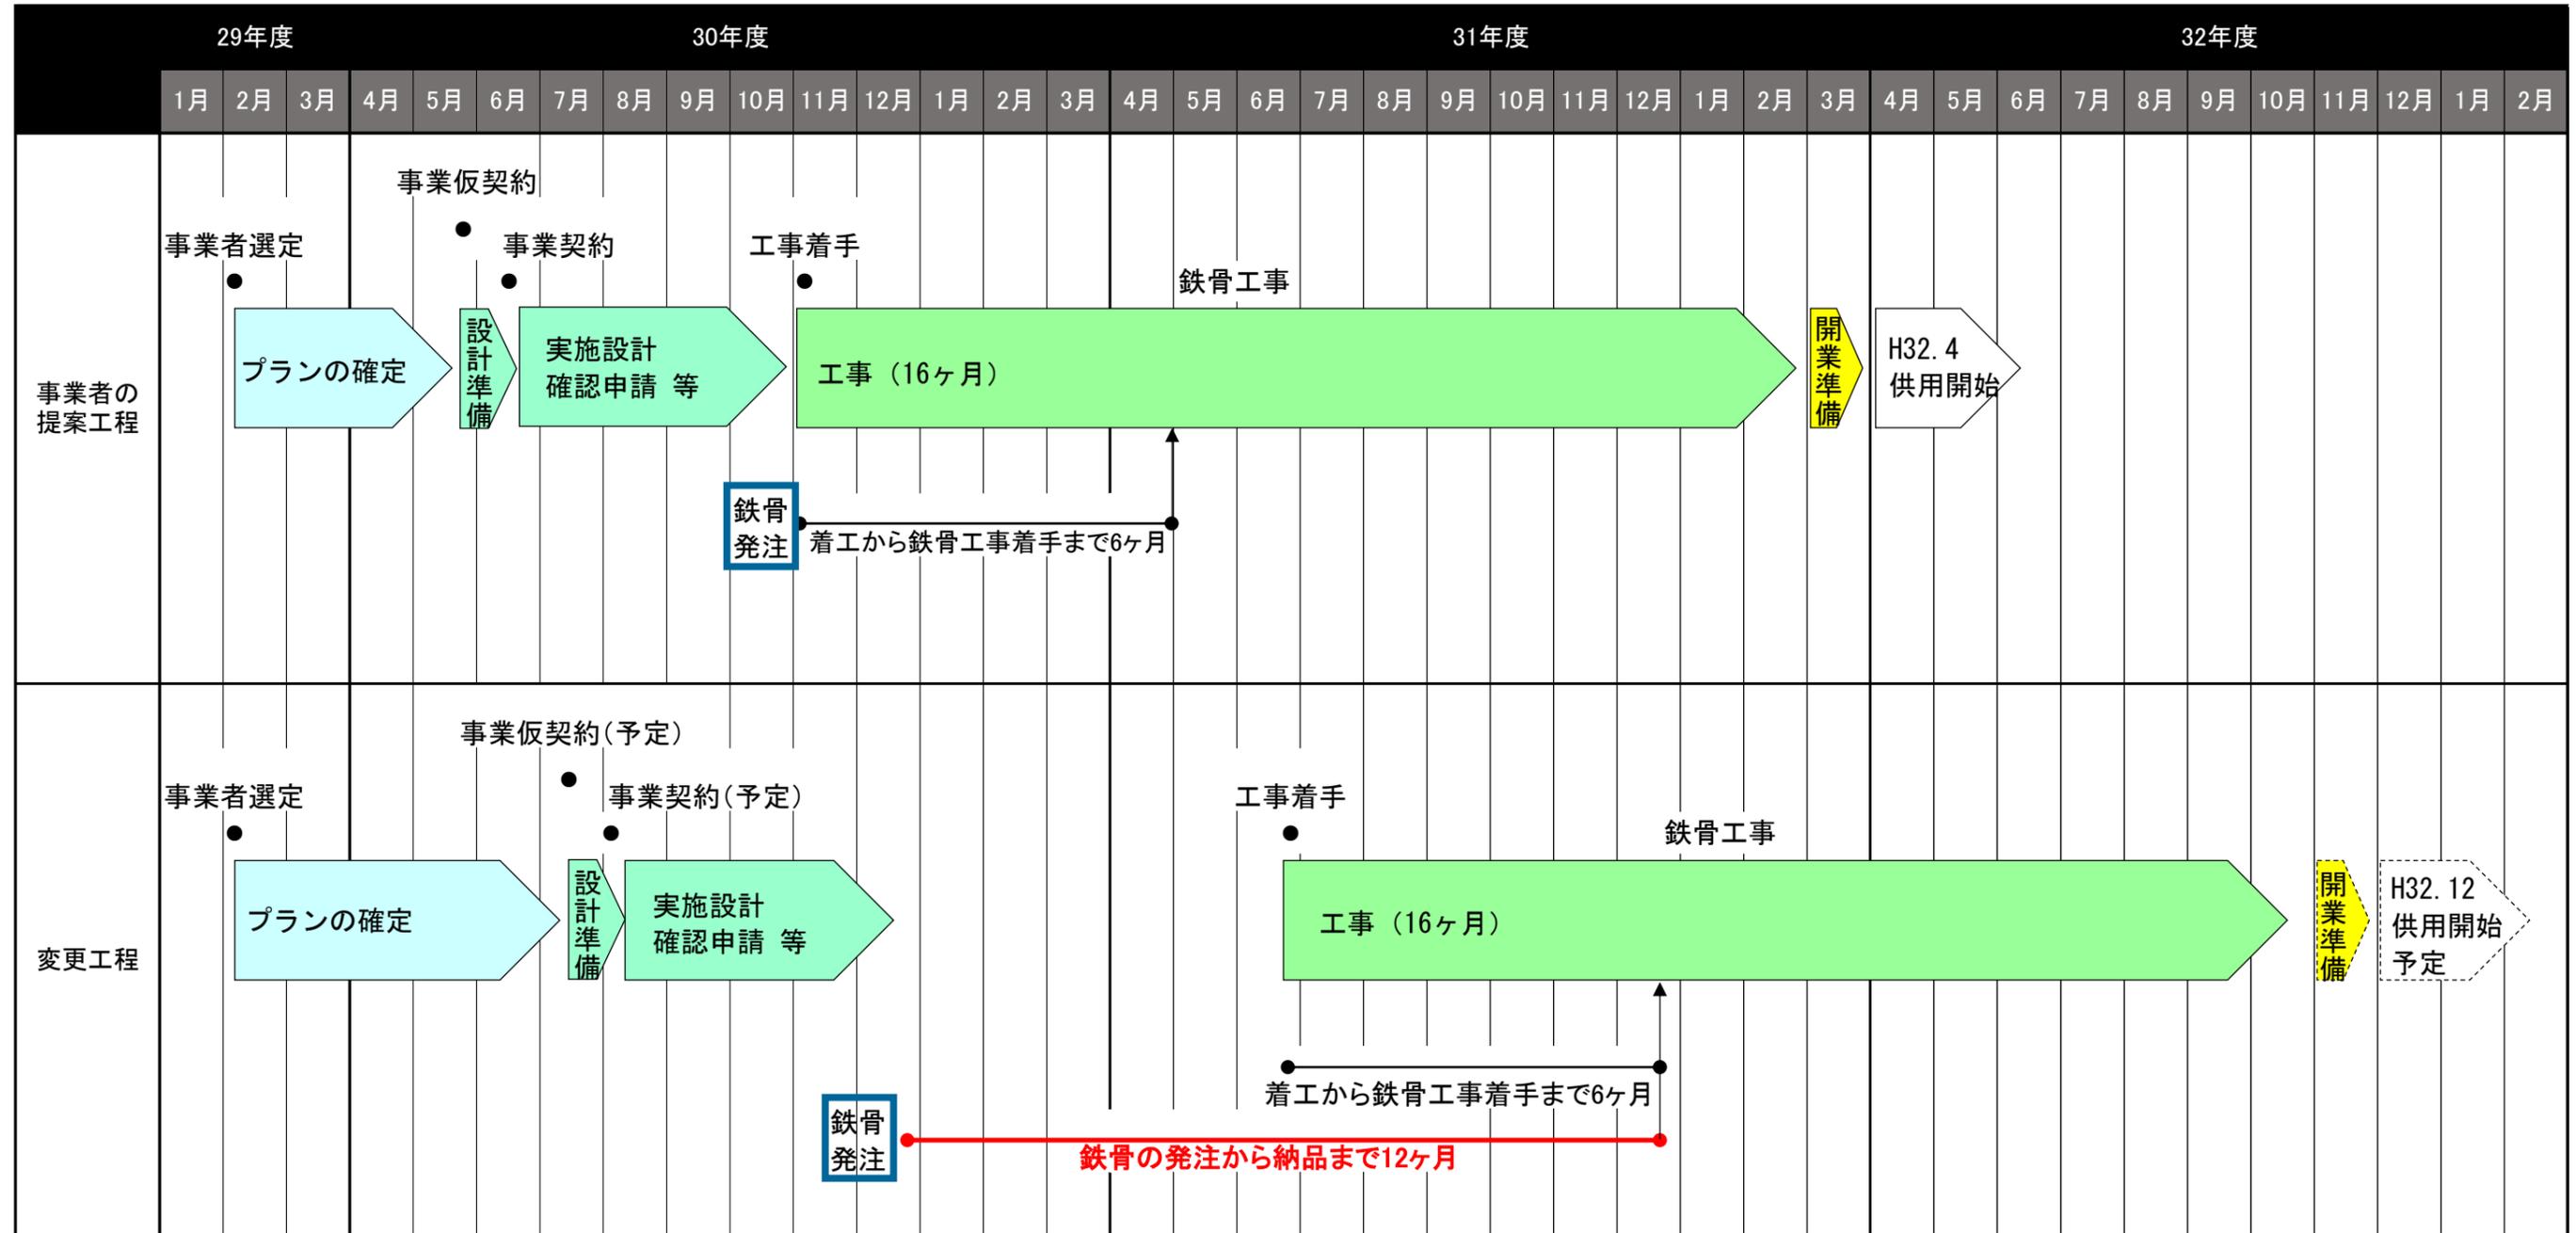

### 【工期変更が必要となった理由】

- ① 需要の面において、東京オリンピック関連工事と東北復興工事の影響で、大規模な工事が多く増えており、鉄骨資材の確保が困難になっている。
- ② 供給の面において、本施設整備の鉄骨資材は、全国で4社しか取り扱っていないが、うち1社で6月～8月の間、工場の改修が実施されており、減産となっている。

③ 上記2点から、当初工程通りの鉄骨資材納品が不可となり、メーカーから資材仮押さえの拒否を通告された。(以降仮押さえも不可)
